Id.	Tryb/Numer zadań/RCR	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wykon.	Poprzedniki
1	MS 0	**Centrum Serwisowe grupy PKP PLK S. A. PPM-T**	**1223 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**piątek, 25.sie.28**	**0%**	
2	MS 0	**Postępowanie Administracyjne**	**374 dn**	**piątek, 13.gru.26**	**poniedziałek, 20.gru.27**	**0%**	
3	MS 0	**Pozwolenie na użytkowanie Centrum Serwisowego - 1/2**	**31 dn**	**piątek, 13.gru.26**	**poniedziałek, 25.sty.27**	**0%**	
4	MS 0	**KM nr 3 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy CS do PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) i PSP (Państwowej Straży Pożarnej)**	**0 dn**	**piątek, 13.gru.26**	**piątek, 13.gru.26**	**0%**	**173;270**
5	MS 0	Kontrola lub stanowisko PIS i PSP	14 dn	poniedziałek, 14.gru.26	poniedziałek, 04.sty.27	0%	4
6	MS 0	Złożenie wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie CS do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego	0 dn	poniedziałek, 04.sty.27	poniedziałek, 04.sty.27	0%	5
7	MS 0	Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego	21 dn	wtorek, 05.sty.27	środa, 03.lut.27	0%	6
8	MS 0	Decyzja PNU	0 dn	środa, 03.lut.27	środa, 03.lut.27	0%	7
9	MS 0	**Pozwolenie na użytkowanie układu torowego CS - 2/2**	**31 dn**	**czwartek, 29.paź.27**	**poniedziałek, 29.gru.27**	**0%**	
10	MS 0	**KM nr 5 - Zawiadomienie o zakończeniu budowy CS do PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej) i PSP (Państwowej Straży Pożarnej)**	**0 dn**	**czwartek, 28.paź.27**	**czwartek, 28.paź.27**	**0%**	**271;87**
11	MS 0	Kontrola lub stanowisko PIS i PSP	14 dn	piątek, 29.paź.27	piątek, 19.lis.27	0%	10
12	MS 0	**Złożenie wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie CS do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego**	0 dn	piątek, 19.lis.27	piątek, 19.lis.27	0%	11
13	MS 0	Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego	21 dn	poniedziałek, 22.lis.27	poniedziałek, 20.gru.27	0%	12
14	MS 0	Decyzja PNU	0 dn	poniedziałek, 20.gru.27	poniedziałek, 20.gru.27	0%	13
15	MS 0	**Realizacja GW CS PPM-T by mf**	**654 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**piątek, 25.sie.28**	**0%**	
16	MS 0	**Start Początek budowy CS**	**0 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**pon, 21.kwi.25**	**0%**	
17	MS 0	**Początek realizacji robót budowlanych**	**652 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**piątek, 12.lis.27**	**0%**	**16**
18	MS 1	**I BRANŻA ZAGOSPODAROWANIE TERENU**	**652 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**piątek, 12.lis.27**	**0%**	
19	MS 7	**1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE**	**50 dn**	**środa, 18.cze.27**	**wtorek, 24.sie.27**	**0%**	
20	MS 0	rozbiórki ist. układ torowego	30 dn	środa, 14.lip.27	wtorek, 24.sie.27	0%	275
21	MS 0	rozbiórki pom. warsztatowych hali wachlarzowej	20 dn	środa, 16.cze.27	wtorek, 13.lip.27	0%	275ZK-20 dn
22	MS 3	**2 PZT**	**619 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**piątek, 24.wrz.27**	**0%**	
23	MS 4	**2.1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE**	**376 dn**	**pon, 06.kwi.26**	**piątek, 24.wrz.27**	**0%**	
24	MS 5	2.1.1 Korytowanie	40 dn	pon, 06.kwi.26	wtorek, 02.cze.26	0%	106
25	MS 6	**2.1.2 A Konstrukcja i nawierzchnia dróg i dróg manewrowych - nawierzchnia asfaltowa**	**90 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 06.paź.26**	**0%**	
26	MS 7	2.1.2.1 Podbudowa	60 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 25.sie.26	0%	24;261ZR-10 dn
27	MS 8	2.1.2.2 Nawierzchnia	30 dn	środa, 26.sie.26	wtorek, 06.paź.26	0%	26
28	MS 9	**2.1.3 B Konstrukcja i nawierzchnia między torowiskiem przy hali - nawierzchnia betonowa**	**333 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 21.wrz.27**	**0%**	
29	MS 10	**2.1.3.1 Podbudowa**	**318 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 31.sie.27**	**0%**	
30	MS 0	niekolidujących z ist. układem torowym	40 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 28.lip.26	0%	92;24;261ZR-10 dn
31	MS 0	kolidujących z ist. układem torowym	5 dn	piątek, 25.sie.27	wtorek, 31.sie.27	0%	20
32	MS 11	**2.1.3.2 Nawierzchnia**	**293 dn**	**środa, 29.lip.26**	**wtorek, 21.wrz.27**	**0%**	
33	MS 0	niekolidujących z ist. układem torowym	40 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 22.wrz.26	0%	30
34	MS 0	kolidujących z ist. układem torowym	15 dn	środa, 01.wrz.27	wtorek, 21.wrz.27	0%	31
35	MS 12	**2.1.4 C Konstrukcja i nawierzchnia chodników i opaski - nawierzchnia z kostki brukowej**	**35 dn**	**środa, 24.cze.26**	**wtorek, 11.sie.26**	**0%**	**24**
36	MS 13	2.1.4.1 Podbudowa	20 dn	środa, 24.cze.26	wtorek, 21.lip.26	0%	46
37	MS 14	2.1.4.2 Nawierzchnia	15 dn	środa, 22.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	36
38	MS 15	**2.1.5 D Konstrukcja i nawierzchnia placu składowego w miejscu starej wiaty -nawierzchnia z betonu**	**30 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 14.lip.26**	**0%**	
39	MS 16	2.1.5.1 Podbudowa	10 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 16.cze.26	0%	24
40	MS 17	2.1.5.2 Nawierzchnia	20 dn	środa, 17.cze.26	wtorek, 14.lip.26	0%	39
41	MS 18	**2.1.6 E Konstrukcja i nawierzchnia przed budynkiem głównym - nawierzchnia z kostki granitowej**	**40 dn**	**środa, 17.cze.26**	**wtorek, 11.sie.26**	**0%**	
42	MS 19	2.1.6.1 Podbudowa	20 dn	środa, 17.cze.26	wtorek, 14.lip.26	0%	24;261;201
43	MS 20	2.1.6.2 Nawierzchnia	20 dn	środa, 15.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	42
44	MS 21	**2.1.7 Krawężniki i obrzeża**	**35 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 21.lip.26**	**0%**	
45	MS 22	2.1.7.1 Krawężniki	35 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 21.lip.26	0%	24
46	MS 23	2.1.7.2 Obrzeża	15 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 23.cze.26	0%	24
47	MS 24	2.1.8 Oznakowanie nawierzchni utwardzonych	3 dn	środa, 22.wrz.27	piątek, 24.wrz.27	0%	28;25
48	MS 25	**2.2 ZIELEŃ**	**611 dn**	**pon, 21.kwi.25**	**wtorek, 14.wrz.27**	**0%**	
49	MS 26	2.2.1 Wyżółnka i karczowanie drzew	20 dn	pon, 21.kwi.25	piątek, 19.maj.25	0%	
50	MS 27	2.2.2 Trawnik	60 dn	środa, 02.cze.27	wtorek, 24.sie.27	0%	19ZZ
51	MS 28	2.2.3 Nieski	40 dn	środa, 24.cze.26	wtorek, 18.sie.26	0%	46;261ZZ
52	MS 29	2.2.4 Nasadzenia	15 dn	środa, 25.cze.27	wtorek, 14.wrz.27	0%	50
53	MS 30	2.3 WIATA I INNE ELEMENTY MONTAŻOWE	20 dn	środa, 15.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	38
54	MS 31	**3 KOTŁOWNIA**	**71 dn**	**środa, 04.cze.27**	**piątek, 12.lis.27**	**0%**	**21**
55	MS 32	**3.1 Roboty ziemne**	**35 dn**	**środa, 04.cze.27**	**wtorek, 21.wrz.27**	**0%**	
56	MS 33	3.1.1 Wykopy	5 dn	środa, 04.cze.27	wtorek, 10.cze.27	0%	20ZR-50%
57	MS 34	3.1.2 Zasypywanie wykopów	10 dn	środa, 08.wrz.27	wtorek, 21.wrz.27	0%	60
58	MS 35	**3.2 Konstrukcja**	**56 dn**	**środa, 11.cze.27**	**środa, 27.paź.27**	**0%**	
59	MS 36	3.2.1 Podkłady	5 dn	środa, 11.cze.27	wtorek, 17.cze.27	0%	56
60	MS 37	3.2.2 Ławy fundamentowe	15 dn	środa, 18.cze.27	wtorek, 07.wrz.27	0%	59
61	MS 38	3.2.3 Ściany żelbetowe	10 dn	środa, 08.wrz.27	wtorek, 21.wrz.27	0%	60
62	MS 39	3.2.4 Belki, nadproża, wieńce	10 dn	piątek, 24.wrz.27	czwartek, 07.paź.27	0%	61;68;63
63	MS 40	3.2.5 Słupy	7 dn	środa, 08.wrz.27	czwartek, 16.wrz.27	0%	60
64	MS 41	3.2.6 Stropy	14 dn	piątek, 08.paź.27	środa, 27.paź.27	0%	62
65	MS 42	3.2.7 Zbrojenie fundamentów	7 dn	środa, 18.sie.27	czwartek, 26.sie.27	0%	60RR
66	MS 43	3.3 Izolacja fundamentów	10 dn	piątek, 27.sie.27	piątek, 10.wrz.27	0%	60ZR-50%
67	MS 44	3.4 Posadzka	10 dn	czwartek, 28.paź.27	piątek, 12.lis.27	0%	64;68
68	MS 45	3.5 Ściany murowe	12 dn	środa, 08.wrz.27	czwartek, 23.wrz.27	0%	60
69	MS 46	3.6 Wykończenie wewnętrzne	20 dn	piątek, 24.wrz.27	czwartek, 21.paź.27	0%	68
70	MS 47	3.7 Stolarka	10 dn	piątek, 24.wrz.27	czwartek, 07.paź.27	0%	68
71	MS 48	3.8 Wykończenie zewnętrzne	15 dn	piątek, 08.paź.27	czwartek, 28.paź.27	0%	70
72	MS 49	**4 ŚCIANA SZCZYTOWA**	**72 dn**	**środa, 14.lip.27**	**czwartek, 21.paź.27**	**0%**	**21**
73	MS 50	4.1 ROZBIÓRKI	5 dn	środa, 14.lip.27	wtorek, 20.lip.27	0%	21
74	MS 51	4.2 ROBOTY ZIEMNE	10 dn	środa, 08.wrz.27	wtorek, 21.wrz.27	0%	57ZZ
75	MS 52	**4.3 KONSTRUKCJA**	**55,5 dn**	**środa, 14.lip.27**	**środa, 29.wrz.27**	**0%**	
76	MS 53	4.3.1 Podkłady	4 dn	środa, 11.sie.27	poniedziałek, 16.sie.27	0%	56
77	MS 54	4.3.2 Ławy fundamentowe	10 dn	wtorek, 17.sie.27	poniedziałek, 30.sie.27	0%	76
78	MS 55	4.3.3 Stopy fundamentowe	10 dn	wtorek, 17.sie.27	poniedziałek, 30.sie.27	0%	76
79	MS 56	4.3.4 Wzmocnienie fundamentów	4 dn	wtorek, 31.sie.27	piątek, 03.wrz.27	0%	77;78
80	MS 57	4.3.5 Belki, nadproża, wieńce	10 dn	środa, 15.wrz.27	środa, 29.wrz.27	0%	82;85RR+50%
81	MS 58	4.3.6 Ściany	5 dn	poniedziałek, 27.sie.27	piątek, 10.wrz.27	0%	85RR
82	MS 59	4.3.7 Słupy	7 dn	poniedziałek, 06.wrz.27	wtorek, 14.wrz.27	0%	85RR
83	MS 60	4.3.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej	7 dn	środa, 14.lip.27	czwartek, 22.lip.27	0%	
84	MS 61	4.4 IZOLACJA FUNDAMENTÓW	4 dn	wtorek, 31.sie.27	piątek, 03.wrz.27	0%	78
85	MS 62	4.5 ROBOTY MUROWE	15 dn	poniedziałek, 06.wrz.27	piątek, 24.wrz.27	0%	79
86	MS 63	4.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	10 dn	piątek, 08.paź.27	czwartek, 21.paź.27	0%	71RR;85
87	MS 0	**Punkt kontrolny: Zakończenie budowy kotłowni, ściany oczyszczonej hali wachlarzowej**	**0 dn**	**czwartek, 28.paź.27**	**czwartek, 28.paź.27**	**0%**	**96;71;69**
88	MS 68	**II BRANŻA BUDOWLANA**	**410 dn**	**czwartek, 24.kwi.25**	**środa, 02.gru.26**	**0%**	
170	MS 0	**KM nr 1 - Zakończenie robót ziemnych i fundamentowych CS**	**0 dn**	**czwartek, 22.cze.26**	**czwartek, 22.cze.26**	**0%**	**94;195**
171	MS 0	**KM nr 2 - Stan surowy otwarty Centrum Serwisowego**	**0 dn**	**wtorek, 30.cze.26**	**wtorek, 30.cze.26**	**0%**	**138**
172	MS 0	**Punkt kontrolny: Stan surowy zamknięty Centrum Serwisowego**	**0 dn**	**wtorek, 06.paź.26**	**wtorek, 06.paź.26**	**0%**	**144**
173	MS 0	**Punkt kontrolny: Zakończenie montażu pełnego wyposażenia - budowy CS**	**0 dn**	**środa, 02.gru.26**	**środa, 02.gru.26**	**0%**	**168;200;226;235;259;30**
174	MS 141	**III BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**375 dn**	**czwartek, 24.kwi.25**	**wtorek, 13.paź.26**	**0%**	
175	MS 142	**1 ROZDZIELNIA**	**375 dn**	**piątek, 12.wrz.25**	**wtorek, 13.paź.26**	**0%**	
176	MS 143	**1.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	**275 dn**	**piątek, 12.wrz.25**	**wtorek, 13.paź.26**	**0%**	
177	MS 144	1.1.1 Stacja elektroenergetyczna	30 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	171
178	MS 145	1.1.2 Rozdzielnice elektryczne	20 dn	środa, 31.gru.25	czwartek, 29.kwi.26	0%	179
179	MS 146	1.1.3 Okablowanie	30 dn	poniedziałek, 17.lis.25	wtorek, 30.gru.25	0%	180ZR-50%
180	MS 147	1.1.4 Trasy kablowe	30 dn	piątek, 24.paź.25	piątek, 05.gru.25	0%	120
181	MS 148	1.1.5 Oświetlenie	25 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 01.wrz.26	0%	102;135;138;120
182	MS 149	1.1.6 Instalacja uziemiająca/odgromowa	40 dn	piątek, 12.wrz.25	czwartek, 06.lis.25	0%	104RR
183	MS 150	1.1.7 Ogrzewanie elektryczny	30 dn	środa, 31.gru.25	czwartek, 12.lut.26	0%	179
184	MS 151	1.1.8 Uszczelnienia pożarowe	15 dn	poniedziałek, 06.kwi.26	poniedziałek, 27.kwi.26	0%	113;119
185	MS 152	1.1.9 Instalacja fotowoltaiczna	25 dn	piątek, 30.sty.26	czwartek, 05.mar.26	0%	118
186	MS 153	1.1.10 Próby i pomiary elektryczne	10 dn	środa, 30.wrz.26	wtorek, 13.paź.26	0%	181;155;178
187	MS 154	**1.2 INSTALACJE TELETECHNICZNE**	**215 dn**	**poniedziałek, 17.lis.25**	**wtorek, 22.wrz.26**	**0%**	
188	MS 155	1.2.1 Instalacja teleinformatyczna	40 dn	poniedziałek, 17.lis.25	czwartek, 15.sty.26	0%	180ZR-50%
189	MS 156	1.2.2 System kontroli dostępu	40 dn	wtorek, 30.cze.26	poniedziałek, 24.sie.26	0%	188;134RR+30%
190	MS 157	1.2.3 System telewizji dozorowej	40 dn	wtorek, 30.cze.26	poniedziałek, 24.sie.26	0%	188;134RR+30%
191	MS 158	1.2.4 System sygnalizacji włamania i napadu	40 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 22.wrz.26	0%	188;148;150
192	MS 159	1.2.5 System sygnalizacji pożarowej	20 dn	wtorek, 30.cze.26	poniedziałek, 27.lip.26	0%	188;134RR+30%
193	MS 160	1.2.6 System oddymiania	25 dn	poniedziałek, 06.kwi.26	wtorek, 12.maj.26	0%	188;140RR
194	MS 161	**2 PRZYŁĄCZA, KOLIZJE, PRZEKIADKI**	**250 dn**	**czwartek, 24.kwi.25**	**poniedziałek, 20.kwi.26**	**0%**	
195	MS 162	2.1 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	40 dn	piątek, 13.lut.26	piątek, 10.kwi.26	0%	92ZR-50%
196	MS 163	2.2 KANALIZACJA TELETECHNICZNA	30 dn	piątek, 06.mar.26	poniedziałek, 20.kwi.26	0%	92
197	MS 164	2.3 PRZEBUDOWA INSTYNIEJĄCEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ	30 dn	czwartek, 24.kwi.25	czwartek, 05.cze.25	0%	91RR
198	MS 165	2.4 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH SN 15kV	40 dn	czwartek, 24.kwi.25	czwartek, 19.cze.25	0%	91RR
199	MS 166	2.5 ZASLANIE INSTALACJI W TERENIE	20 dn	piątek, 06.mar.26	piątek, 03.kwi.26	0%	92
200	MS 167	**IV BRANŻA SANITARNA**	**321,5 dn**	**piątek, 04.lip.25**	**czwartek, 08.paź.26**	**0%**	
201	MS 168	1 INSTALACJA WENTYLACJI	50 dn	poniedziałek, 06.kwi.26	wtorek, 16.cze.26	0%	116
202	MS 169	2 INSTALACJA KLIMATYZACJI	30 dn	poniedziałek, 06.kwi.26	wtorek, 19.maj.26	0%	116
203	MS 170	**3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ**	**285 dn**	**piątek, 04.lip.25**	**wtorek, 18.sie.26**	**0%**	
204	MS 171	3.1 Roboty ziemne	30 dn	piątek, 04.lip.25	czwartek, 14.sie.25	0%	91
205	MS 172	3.2 Rury, wpusty	20 dn	piątek, 15.sie.25	czwartek, 11.wrz.25	0%	204
206	MS 173	3.3 Przybory	15 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 18.sie.26	0%	134
207	MS 174	3.4 Płukanie, próby szczelności	5 dn	piątek, 12.wrz.25	czwartek, 18.wrz.25	0%	205
208	MS 175	**4 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ**	**45 dn**	**piątek, 04.lip.25**	**czwartek, 04.wrz.25**	**0%**	
209	MS 176	4.1 Roboty ziemne	20 dn	piątek, 04.lip.25	czwartek, 31.lip.25	0%	91
210	MS 177	4.2 Rury, wpusty	20 dn	piątek, 01.sie.25	czwartek, 28.sie.25	0%	209
211	MS 178	4.3 Płukanie, próby szczelności	5 dn	piątek, 29.sie.25	czwartek, 04.wrz.25	0%	210
212	MS 179	**5 INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ MYJNI**	**40 dn**	**piątek, 04.lip.25**	**czwartek, 28.sie.25**	**0%**	
213	MS 180	5.1 Roboty ziemne	15 dn	piątek, 04.lip.25	czwartek, 24.lip.25	0%	91
214	MS 181	5.2 Rury, wpusty	20 dn	piątek, 25.lip.25	czwartek, 21.sie.25	0%	213
215	MS 182	5.3 Płukanie, próby szczelności	5 dn	piątek, 22.sie.25	czwartek, 28.sie.25	0%	214
216	MS 183	**6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**	**25 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 07.lip.26**	**0%**	
217	MS 184	6.1 Rury, wpusty	20 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 30.cze.26	0%	139;140
218	MS 185	6.2 Płukanie, próby szczelności	5 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 07.lip.26	0%	217
219	MS 186	**7 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ AWARYJNEJ**	**25 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 07.lip.26**	**0%**	
220	MS 187	7.1 Rury, wpusty	20 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 30.cze.26	0%	139;140
221	MS 188	7.2 Płukanie, próby szczelności	5 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 07.lip.26	0%	220
222	MS 189	**8 INSTALACJA WODOCIĄGOWA**	**107,5 dn**	**wtorek, 17.mar.26**	**wtorek, 18.sie.26**	**0%**	
223	MS 190	8.1 Rury	50 dn	wtorek, 17.mar.26	piątek, 29.maj.26	0%	95;116ZR-50%
224	MS 191	8.2 Izolacja termiczna, rozszerzowa	15 dn	piątek, 29.maj.26	piątek, 19.cze.26	0%	223
225	MS 192	8.3 Armatura	15 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 18.sie.26	0%	134
226	MS 193	8.4 Baterie	15 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 18.sie.26	0%	134
227	MS 194	8.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	10 dn	piątek, 29.maj.26	piątek, 12.cze.26	0%	223
228	MS 195	**9 INSTALACJA GAZOWA**	**35 dn**	**środa, 01.lip.26**	**wtorek, 18.sie.26**	**0%**	
229	MS 196	9.1 Rury	20 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 28.lip.26	0%	143
230	MS 197	9.2 Armatura, skrzynki	10 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	229
231	MS 198	9.3 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	5 dn	środa, 12.sie.26	wtorek, 18.sie.26	0%	230
232	MS 199	**10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PROMIENNIKI**	**50 dn**	**środa, 01.lip.26**	**wtorek, 08.wrz.26**	**0%**	
233	MS 200	10.1 Rury	30 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	143
234	MS 201	10.2 Izolacja termiczna	30 dn	środa, 08.lip.26	wtorek, 18.sie.26	0%	233RR+5 dn
235	MS 202	10.3 Armatura	10 dn	środa, 19.sie.26	wtorek, 01.wrz.26	0%	234
236	MS 203	10.4 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	5 dn	środa, 02.wrz.26	wtorek, 08.wrz.26	0%	235
237	MS 204	10.5 Inne	5 dn	środa, 05.sie.26	wtorek, 11.sie.26	0%	233ZZ
238	MS 205	**11 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO**	**50 dn**	**środa, 01.lip.26**	**wtorek, 08.wrz.26**	**0%**	
239	MS 206	11.1 Rury	20 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 28.lip.26	0%	143;140
240	MS 207	11.2 Izolacja termiczna	25 dn	środa, 08.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	239RR+5 dn
241	MS 208	11.3 Armatura	15 dn	środa, 12.sie.26	wtorek, 01.wrz.26	0%	240
242	MS 209	11.4 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	5 dn	środa, 02.wrz.26	wtorek, 08.wrz.26	0%	241
243	MS 210	11.5 Inne	5 dn	środa, 22.lip.26	wtorek, 28.lip.26	0%	239ZZ
244	MS 211	**12 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - NAGRZEWNICE**	**55 dn**	**środa, 03.cze.26**	**wtorek, 18.sie.26**	**0%**	
245	MS 212	12.1 Rury	20 dn	środa, 03.cze.26	wtorek, 30.cze.26	0%	116;143ZZ
246	MS 213	12.2 Izolacja termiczna	25 dn	środa, 10.cze.26	wtorek, 14.lip.26	0%	245RR+5 dn
247	MS 214	12.3 Urządzenia	30 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 11.sie.26	0%	245
248	MS 215	12.4 Armatura	10 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 14.lip.26	0%	245
249	MS 216	12.5 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	5 dn	środa, 12.sie.26	wtorek, 18.sie.26	0%	247
250	MS 217	12.6 Inne	5 dn	środa, 24.cze.26	wtorek, 30.cze.26	0%	245ZZ
251	MS 218	**13 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**	**100 dn**	**poniedziałek, 06.kwi.26**	**wtorek, 25.sie.26**	**0%**	
252	MS 219	13.1 Rury	30 dn	poniedziałek, 06.kwi.26	wtorek, 19.maj.26	0%	116
253	MS 220	13.2 Izolacja termiczna	30 dn	poniedziałek, 13.kwi.26	wtorek, 26.maj.26	0%	252RR+5 dn
254	MS 221	13.3 Grzejniki płytowe	15 dn	środa, 29.lip.26	wtorek, 18.sie.26	0%	130;134
255	MS 222	13.4 Rozdzielacze	10 dn	środa, 06.maj.26	wtorek, 19.maj.26	0%	252ZZ
256	MS 223	13.5 Armatura	5 dn	środa, 13.maj.26	wtorek, 19.maj.26	0%	252ZZ
257	MS 224	13.6 Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji	5 dn	środa, 19.sie.26	wtorek, 25.sie.26	0%	254
258	MS 225	13.7 Inne	5 dn	środa, 13.maj.26	wtorek, 19.maj.26	0%	252ZZ
259	MS 226	14 KOTŁOWNIA	40 dn	czwartek, 13.sie.26	czwartek, 08.paź.26	0%	261;123RR+40%;231R
260	MS 227	15 INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA	50 dn	środa, 01.lip.26	wtorek, 08.wrz.26	0%	143
261	MS 228	16 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE	50 dn	piątek, 23.sty.26	piątek, 03.kwi.26	0%	105
262	MS 229	**V BRANŻA TOROWA**	**497 dn**	**poniedziałek, 17.lis.25**	**poniedziałek, 18.paź.27**	**0%**	
263	MS 230	**1 ROBOTY TOROWE**	**487 dn**	**poniedziałek, 17.lis.25**	**poniedziałek, 18.paź.27**	**0%**	
264	MS 231	1.1 Ornizi	40 dn	piątek, 06.mar.26	wtorek, 05.maj.26	0%	92
265	MS 232	**1.2 Budowa torów kolejowych zewnętrznych**	**335 dn**	**piątek, 26.cze.26**	**poniedziałek, 18.paź.27**	**0%**	
266	MS 0	niekolidujących z ist. układem torowym	120 dn	piątek, 26.cze.26	piątek, 11.gru.26	0%	106;269
267	MS 0	kolidujących z ist. układem torowym	39 dn	środa, 25.sie.27	poniedziałek, 18.paź.27	0%	20;264ZZ
268	MS 233	**1.3 Budowa torów kolejowych wewnętrznych**	**40 dn**	poniedziałek, 17.lis.25	czwartek, 15.sty.26	0%	102
269	MS 234	**1.4 Płyta torowa**	**40 dn**	czwartek, 30.kwi.26	czwartek, 25.cze.26	0%	92;261;196;195ZR+30
270	MS 0	**Punkt kontrolny: Zakończenie robót torowych I PZT niekolidujących i ist. układem torowym**	**0 dn**	**piątek, 11.gru.26**	**piątek, 11.gru.26**	**0%**	**266;27;33;45;85;91;93**
271	MS 0	**Punkt kontrolny: Zakończenie robót torowych I PZT**	**0 dn**	**poniedziałek, 18.paź.27**	**poniedziałek, 18.paź.27**	**0%**	**267;34;37;47;52**
272	MS 0	**Koniec: Realizacji robót budowlanych**	**0 dn**	**piątek, 19.lis.27**	**piątek, 19.lis.27**	**0%**	**173;87;12**
273	MS 0	**Inne**	**111 dn**	**środa, 03.kwi.27**	**wtorek, 13.lip.27**	**0%**	
274	MS 0	**KM nr 4 - Możliwy najwcześniejszy termin przerwadzki**	**0 dn**	**środa, 03.kwi.27**	**środa, 03.kwi.27**	**0%**	**173;8**
275	MS 0	Przeprowadzka z hali wachlarzowej na Centrum Serwisowe	60 dn	wtorek, 30.kwi.27	wtorek, 13.lip.27	0%	274

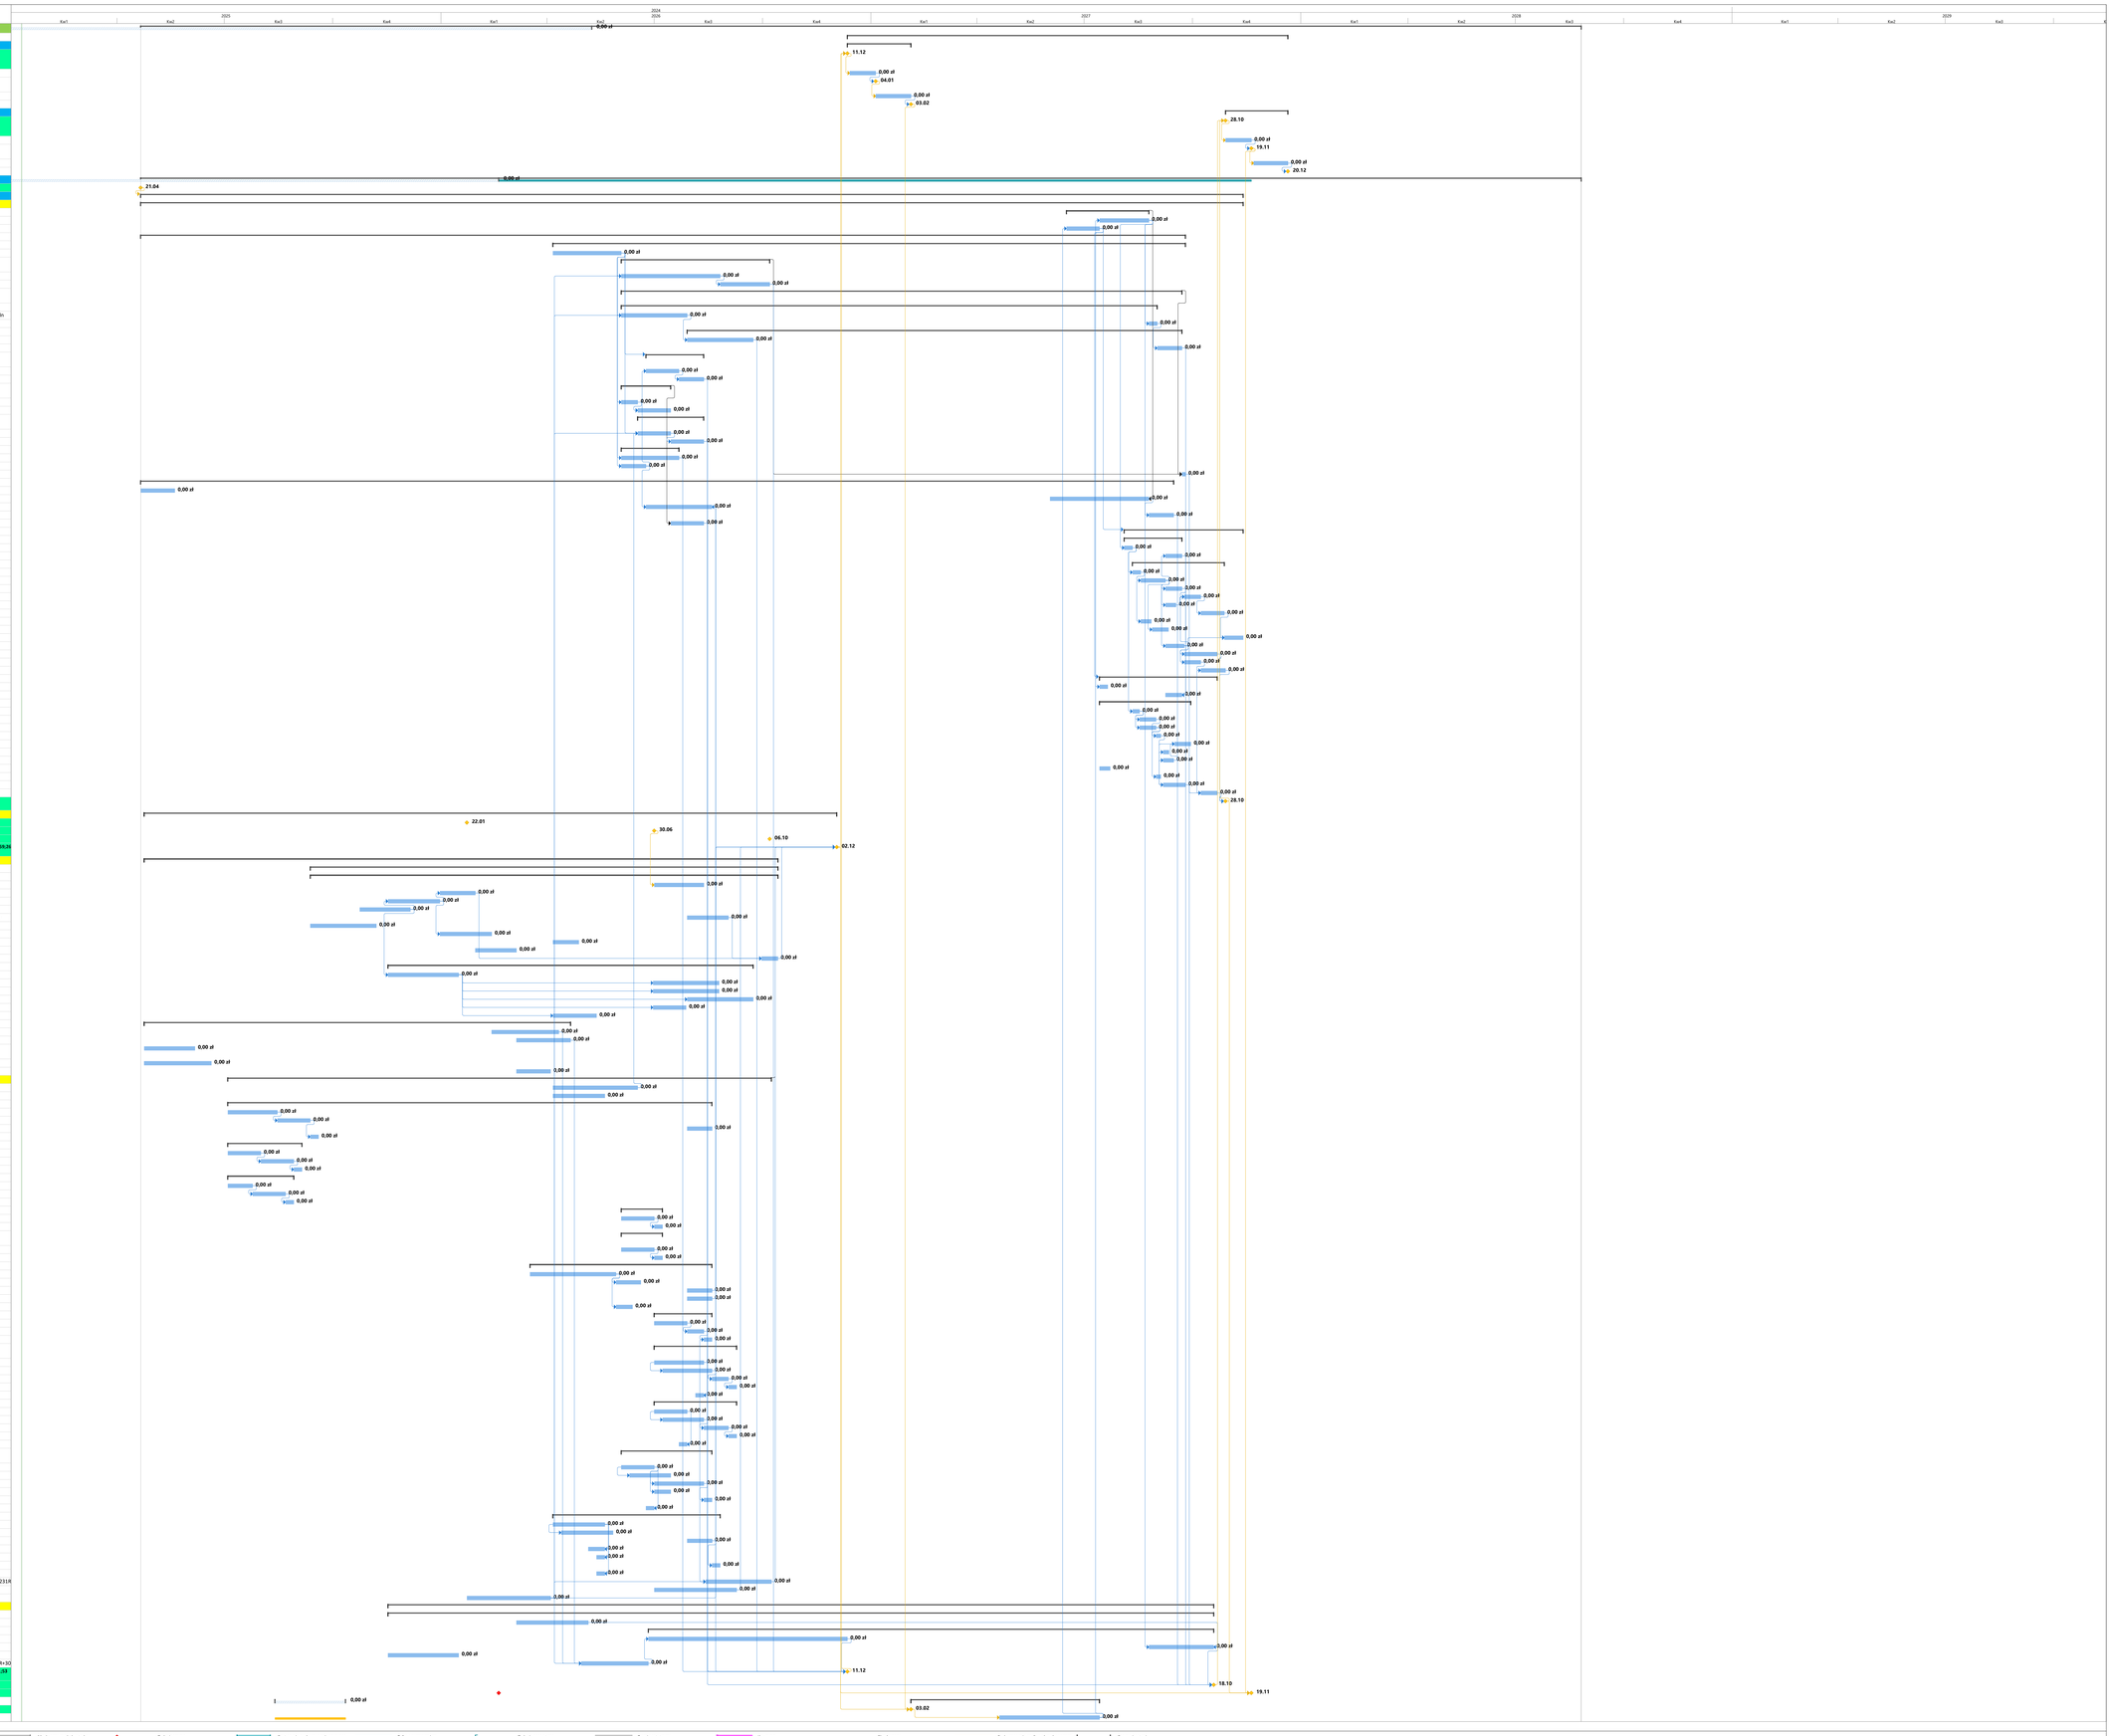

Projekt: Centrum_Serwisowe_PP
Data: piątek, 10-cze-25

Zadanie | Podział | Punkt kontrolny | Podsumowanie | Podsumowanie projektu | Zadanie nieaktywne | Nieaktywny punkt kontrolny | Podsumowanie nieaktywne | Zadanie ręczne | Podsumowanie ręczne | Rozstawione podsumowania rozwinięte | Tylko z rozpoczęciem | Tylko z czasem trwania | Tylko z zakończeniem | Zadania zewnętrzne | Zewnętrzne punkty kontrolne | Termin ostateczny | Opóźnione | Krytyczne | Krytyczne podział | Plan bazowy | Punkt kontrolny według planu bazowego | Podsumowanie według planu bazowego | Postęp | Ręczne (postęp) | Postęp
